





Survey Apparatuur		
Survey vaartuig	:	Pien (Van den Herk Sliedrecht)
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatbepaling	:	RTK GNSS/Applanix INS30
MRU / heading	:	Applanix Wavemaster
SVP	:	Valeport Swift SVP Profiler / (Valeport mini-SVS(head)
Software	:	Teledyne PDS
Geodetische parameters		
Coördinatsysteem	:	Rijksdriehoek
Hcogte/Dieptes	:	RTK
Geodetische Datum	:	Dutch Datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2018





VERSCHILKAART t.o.v meting MEI

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen verschil t.o.v vorige peiling

Dieptecijfers : verschillen 1m-cellen in grid 20x20m verschil t.o.v meting MEI

Eemsgeul vak P3. Nautische monitorings diepte: NAP -11.50m / LAT -9.80m

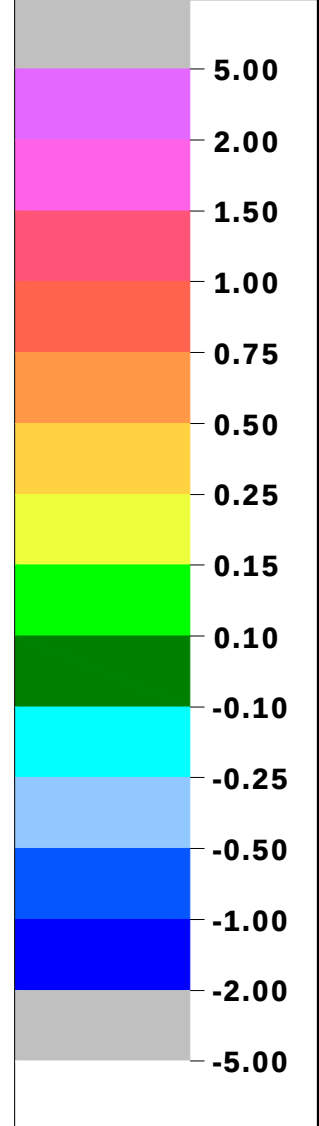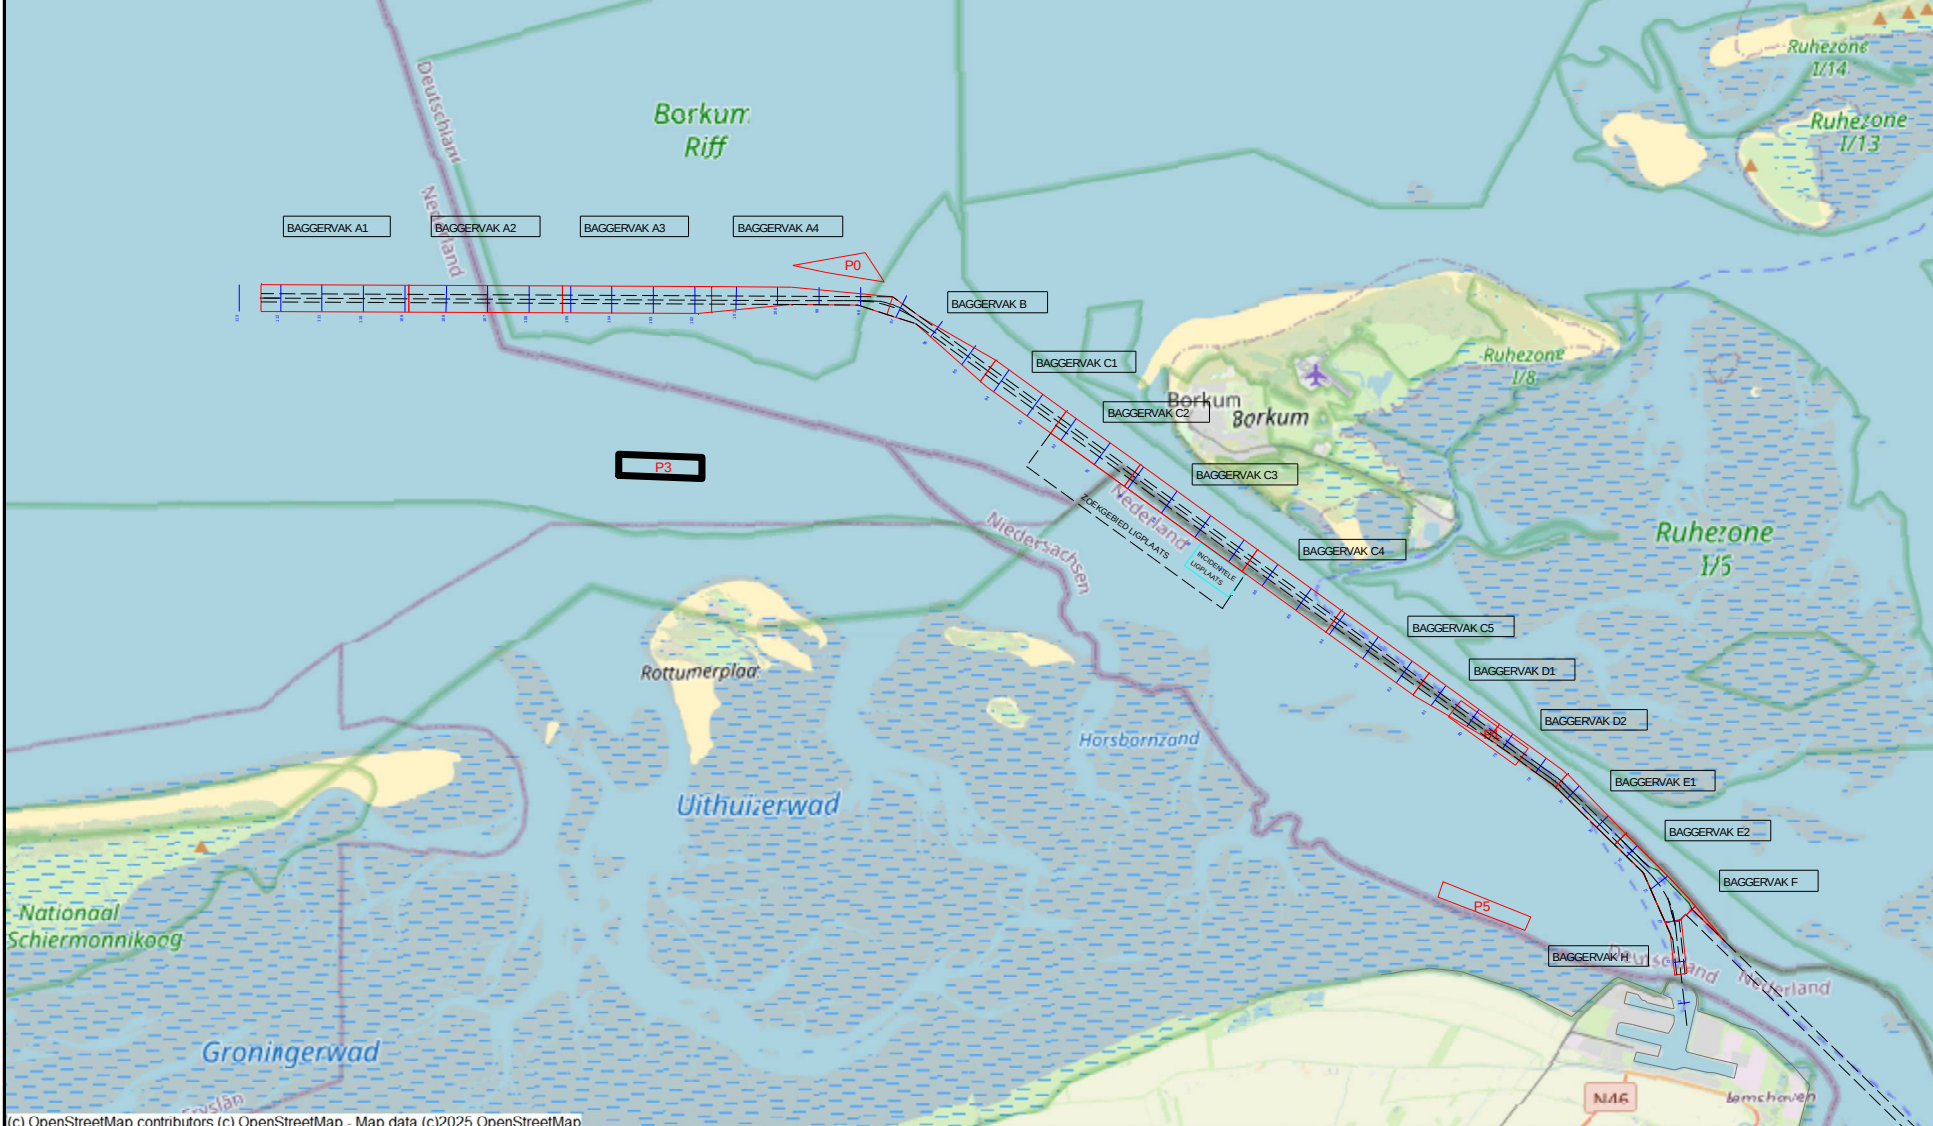

versie C			
versie B			
versie A			
wijziging	betreft	datum	initialen
VAN DEN HERIK - SLIEDRECHT Peil- en meetdienst Industrieweg 24 Postbus 191 3360 AD Sliedrecht tel.0184-412881 fax.0184-411937			
Besteksnaam			
Onderhouds Baggeren Eemsgeul			
Contractpeiling JULI na Baggerprogramma			
Bestelnummer		Bestelnummer	
31169408		31169408	
Bestelnummer		Bestelnummer	
841 x 1500		841 x 1500	
Formaat		Formaat	
1 : 2000		1 : 2000	
Getekend		Getekend	
JBO		JBO	
Datum		Datum	
03-07-2025		03-07-2025	
Opdrachtgever		Opdrachtgever	
Rijkswaterstaat PPO		Rijkswaterstaat PPO	
Tekeningsnr		Tekeningsnr	
250703_103_01_P3_DIF_M		250703_103_01_P3_DIF_M	
