

Survey Apparatuur

Survey vaartuig	:	Pien (Van den Herik Sliedrecht)
Echosounder	:	Teledyne RESON SEABAT T50-R
Plaatbepaling	:	RTK GNSS/Applanix INS30
MRU / heading	:	Applanix Wavemaster
SVP	:	Valeport Swift SVP Profiler / (Valeport mini-SVS(head)
Software	:	Teledyne PDS

Geodetische parameters

Coördinatensysteem	:	Rijksdriehoek
Hoogte/Dieptes	:	RTK
Geodetische Datum	:	Dutch Datum
Projectie	:	RDNAPTRANS 2018

VERSCHILKAART t.o.v 3dmodel-NGD

Dieptekleuren: 1x1m gridcellen verschil t.o.v NGD
Dieptecijfers : minst gepeilde dieptes 1m-cellen in grid 20x20m verschil t.o.v NGD

Eemsgeul vak C3. Nautische Gegarandeerde diepte: NAP -15.80m / LAT -14.10m

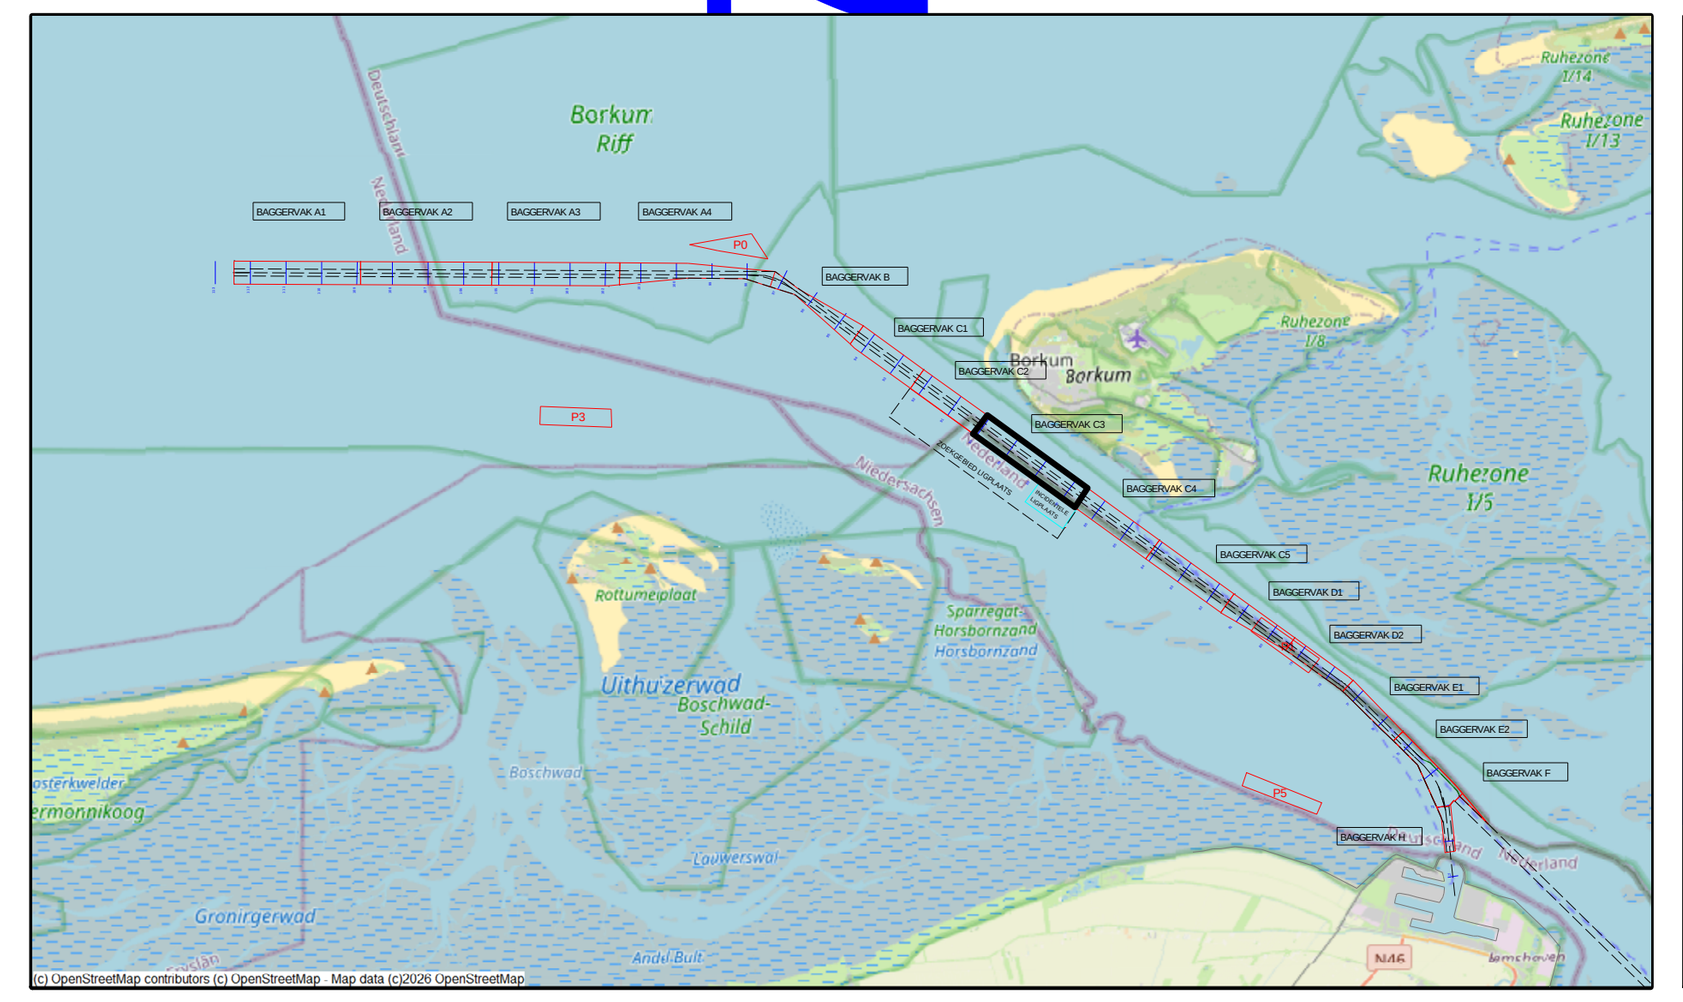

0.00	NGD	
-0.10	Interventie waarde	
-0.50	Max Onderhoudsdiepte	
-1.00		
-2.00		

versie C			
versie B			
versie A			
wijziging	betreft	datum	initialen

VAN DEN HERIK - SLIEDRECHT

Peil- en meetdienst

Industrieweg 24 Postbus 191 3360 AD Sliedrecht tel.0184-412881 fax.0184-411937

Besteksnaam
Onderhouds Baggeren Eemsgeul
Contractpeiling AUGUSTUS na Baggerprogramma

Betreft onderdeel
Eemsgeul vak C3:12-08-2026
Verschilkaart t.o.v 3dmodel-NGD

Besteknummer: 31169408
Formaat: 841 x 2250
Schaal: 1 : 2000

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat PPO

Getekend: MVDM
Datum: 13-8-2026
Tekeningnr.: 260813_101_01_C3_DIF_M
